

INFORME DE VERIFICACIÓN — SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Cumplimiento SEC Chile — Pliegos Técnicos

Obra: San Petersburgo

Fecha de mediciones: 25-05-2026 | Fecha de informe: 07-07-2026

1. Identificación de la instalación

Propietario/Cliente	Inmobiliaria Río Napo Ltda. — RUT 79.754.790-5
Representante Legal	Nicolás Guzmán Cruzat — RUT 7.010.971-9
Domicilio Comercial	Marchant Pereira N.º 201
Dirección de la obra	Av. Salvador Allende N.º 3543, Lote N.º 5B-3
Comuna / Región	Iquique, I Región de Tarapacá
Instalación verificada	Sistema de puesta a tierra — Edificio San Petersburgo
Instalador eléctrico	Kevin Axl Martiz Aravena — Instalador Clase A
N.º registro SEC	18703769-7
Instrumento de ensayo	METREL EurotestXD MI 3155, N.º Serie 24260424
Fecha calibración instrumento	26/08/2024

2. Alcance y norma aplicable

La presente verificación tiene por objeto acreditar el cumplimiento del sistema de puesta a tierra del Edificio San Petersburgo conforme a lo exigido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile y sus pliegos técnicos aplicables, mediante la medición de la resistencia de puesta a tierra (Re) por el método de caída de potencial, con triple medición en el punto de ensayo (Nodo/Tierra) para verificar consistencia de la lectura.

3. Resultados de la medición

Punto ensayado	Medición	Re	Límite	Resultado
Nodo/Tierra	1	1,37 Ω	20 Ω	Pasa
Nodo/Tierra	2	0,95 Ω	20 Ω	Pasa
Nodo/Tierra	3	2,51 Ω	20 Ω	Pasa

El reporte original emitido por el instrumento METREL EurotestXD MI 3155 se adjunta a continuación como Anexo 1:

4. Anexo 1 — Reporte original del instrumento



Results

Datos del instrumento:			
Modelo: EurotestXD MI 3155		Número de serie: 24260424	Fecha de calibración: 26/08/2024
Usuario:			
Nodo/Tierra			Pasa
Resultados			
Re		1,37 Ω	Pasa
Subresultados			
Rc		0,2 kΩ	
Rp		0,1 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		20 Ω	
Parámetros			
FechaHora		25/05/2026 16:55:24	
Nodo/Tierra			Pasa
Resultados			
Re		0,95 Ω	Pasa
Subresultados			
Rc		0,2 kΩ	
Rp		0,1 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		20 Ω	
Parámetros			
FechaHora		25/05/2026 16:57:46	
Nodo/Tierra			Pasa
Resultados			
Re		2,51 Ω	Pasa
Subresultados			
Rc		0,2 kΩ	
Rp		0,2 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		20 Ω	
Parámetros			
FechaHora		25/05/2026 16:59:33	

5. Conclusiones

El sistema de puesta a tierra del Edificio San Petersburgo, ubicado en Av. Salvador Allende N.º 3543, Lote N.º 5B-3, comuna de Iquique, I Región de Tarapacá, presenta valores de resistencia de puesta a tierra (R_e) muy por debajo del límite normativo de $20\ \Omega$, con mediciones de $1,37\ \Omega$, $0,95\ \Omega$ y $2,51\ \Omega$, según consta en el reporte original del instrumento adjunto en el Anexo 1.

En consecuencia, se declara que el sistema de puesta a tierra **CUMPLE** con lo exigido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y sus pliegos técnicos aplicables.

6. Responsable de la verificación

Kevin Axl Martiz Aravena

Instalador Eléctrico Clase A — N.º registro SEC 18703769-7

Fecha de informe: 07-07-2026

7. Anexo 2 — Registro fotográfico


A continuación se presenta el registro fotográfico correspondiente a los trabajos de excavación, instalación y medición del sistema de puesta a tierra del Edificio San Petersburgo.



Fotografía 1. Registro.



Fotografía 2. Registro

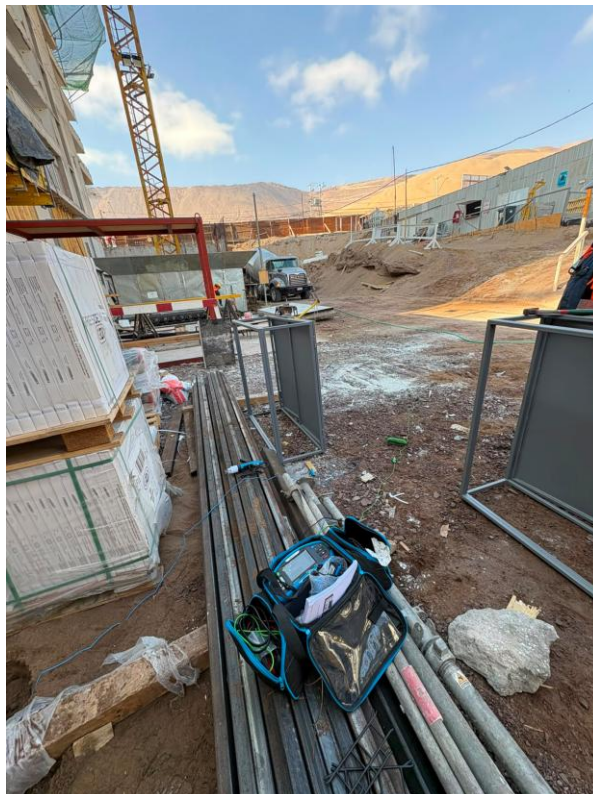

Fotografía 3. Registro.



Fotografía 4. Registro.



Fotografía 5. Registro.



Fotografía 6. Registro.



Fotografía 7. Registro.



Fotografía 8. Registro.
